


NDH – status 29. mai 2018



Status 29.05.2018

- *Sein oppstart, første klarmelding 27. april*
- *Rask snøsmelting – fantastisk vær i mai*
- *Må holde igjen FRITT områder pga økonomi*

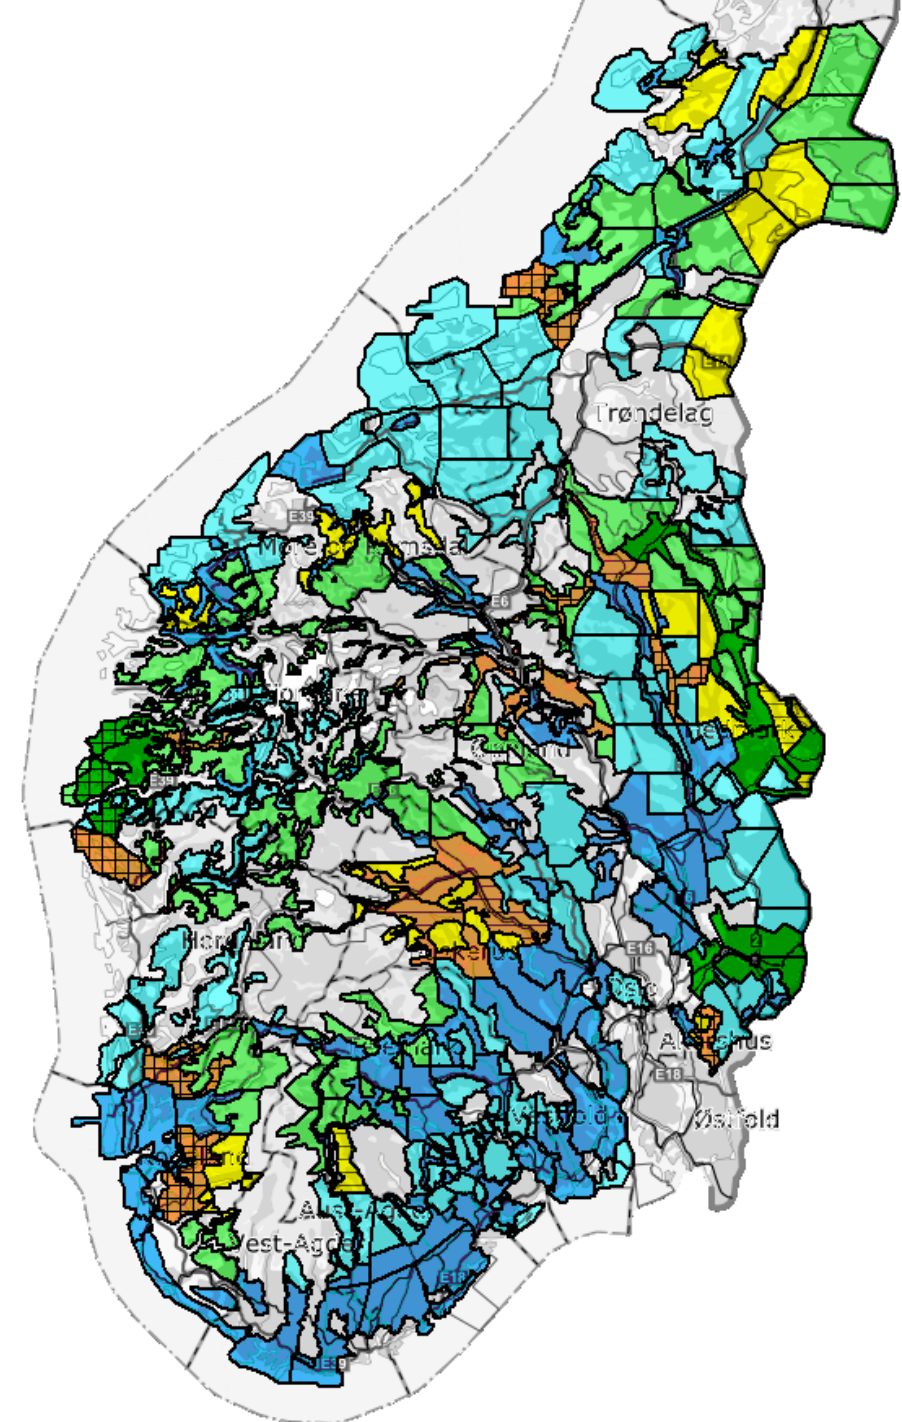

Status 29.05.2018

Område	Totalt areal	Skannet areal	% ferdig	2016	2017	2018	Prioritert 2018	Utført	Rest	% Utført
A	52 804,81	35 138,13	67 %	16 275,90	16 717,22	2145,01	9988,96	2661,20	7327,76	27 %
B	21 469,72	16 562,93	77 %	2 324,37	13 222,66	848,58	2056,78	1111,56	945,22	54 %
C	21 977,59	11 442,11	52 %	5 550,40	3 808,14	2083,57	1711,06	1241,02	470,04	73 %
D	43 238,09	20 839,09	48 %	16 368,16	3 231,62	1239,31	8520,27	1239,31	7280,96	15 %
E	50 379,61	22 322,86	44 %	4 913,82	17 409,04	0	7205,37	850,63	6354,74	12 %
F	39 355,47	5 645,91	14 %	1 900,32	3 262,30	0	2579,58	67,09	2512,49	3 %
Totalt	229 225,29	111 951,02	49 %	47 332,96	57 650,98	6 316,47	32 062,02	7 170,82	24 891,20	22 %

NDH - Organisasjon

- Liv Trongmo Hognes ny faglig ansvarlig
- Ressursutfordringer i laserteamet – vanskelig å balansere lokale oppgaver med NDH arbeid
- Arbeides med utvidelse av teamet
- Status 2017 prosjekter:
 - 16 prosjekter ikke publisert – under kontroll
 - Gjenstår kontroll av høydekurver for 17 prosjekt




Status Høydedata

- 850 prosjekter tilgjengelig i Høydedata.no
- 220 NDH-prosjekter
- Konvertert til NN2000
- 450 daglige brukere
- 480 eksporter i uka (mai)
- Ny release i juni:
 - Feilretting eksport
 - Feilretting DTM/DOM
 - Forbedret høydeprofil eksport



Dybdata

- Prosjekter fra Miljødirektoratet stoppet opp (Hornindalsvatnet og Snåsavatnet)
 - Usikkerhet knyttet til høyden på vannflata
 - Må gå fra grid til punktsky pga mye støy i rådata
- Eldre prosjekter fra NVE?
- Nye prosjekt 2018?

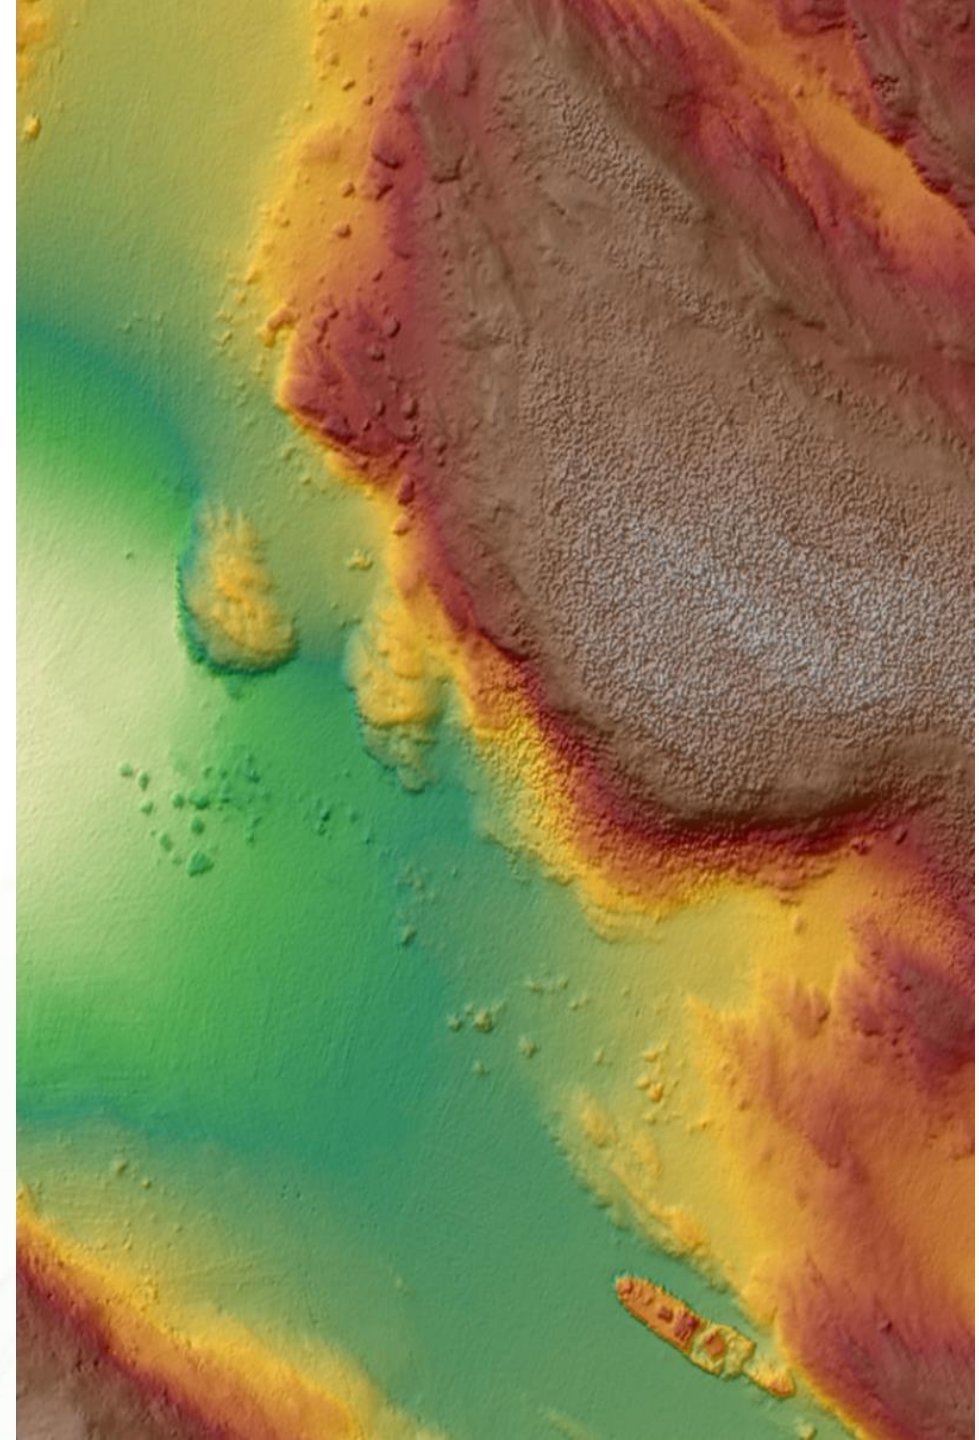

Bildematching

- Alle tilgjengelig bilder ferdig matchet
- Gjenstår klassifisering/deteksjon av vann (støy)
- Laserprosjekter prioriteres
 - Punkttetthet 4 pkt/m²
 - Høydenøyaktighet 0,5 – 0,75 m
 - Klasse 1, 2 og 7
 - RGB-verdier på punktene og nærinfrarødt kodet som intensitet

