




NOTAT

Emne	Sentral forvaltning av FKB – Prosjektorganisering
Til	Geovekst-forum
Fra	Geovekst-sekretariatet
Dato	18.11.2015

Kartverket har lagt opp til følgende organisering:

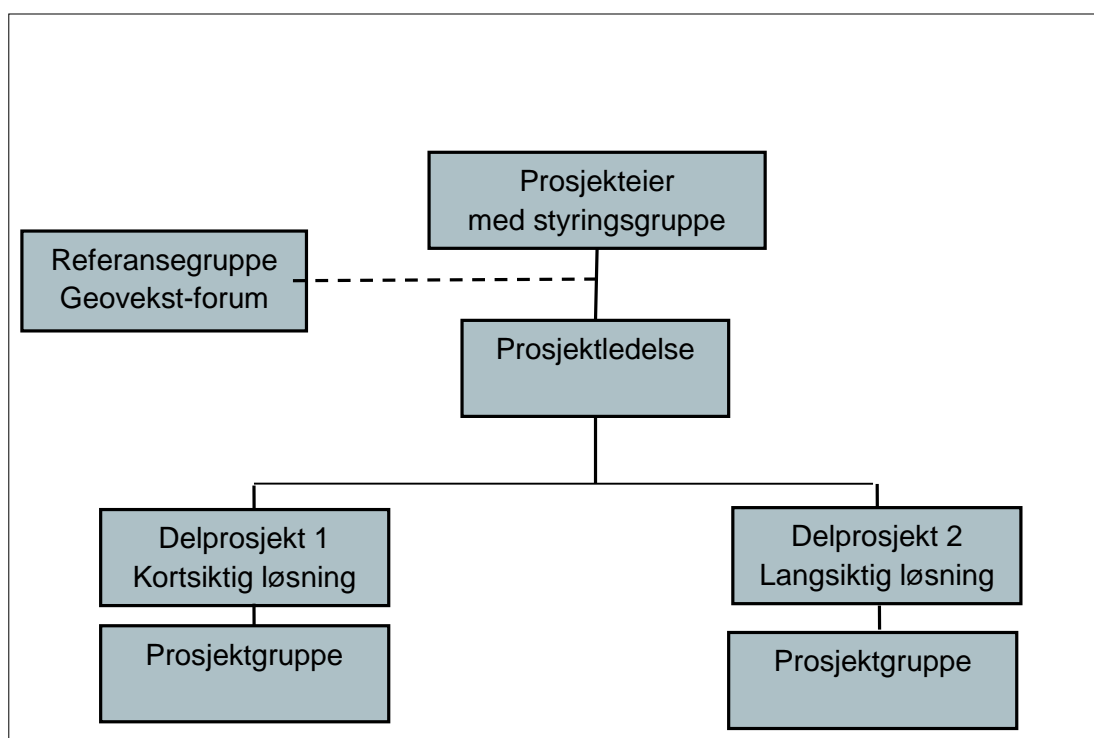

Styringsgruppe

Navn	Rolle
Erik Perstuen	Prosjekteier
Nils Ivar Nes	Prosjektleder
Anne Guro Nøkleby	Kartverket
Olav Petter Aarrestad	Kartverket
John Mikalsen	Statens Vegvesen
Hildegunn Nordheim	NIBIO
Stig Aage Melve	Hamar Kommune
Håkon Løvli	Drammen Kommune

Mandat styringsgruppe:

- Bidra til at prosjektet får nødvendig status og ressurser.
- Sikre at prosjektet er akseptert og godkjent hos andre parter
- Gi råd, anbefalinger og veiledning til prosjektleder
- Utviklingsarbeidet knyttet til QMS som sentral forvaltningsbase blir dekt av Kartverket. Følgelig styrer Kartverket kostnadsbruken. Styringsgruppen skal overvåke kostnadsbruken i forhold til budsjett på øvrige aktiviteter.
- Overvåke framdriften i forhold til prosjektets tidsfrister.
- Overvåke kvaliteten på prosjektets leveranser.
- Revurdere målene om nødvendig.
- Bidra til god kommunikasjon med prosjektets interessenter. Overvåke oppfølging av prosjektets kommunikasjonsplan.
- Koordinere prosjektet med tilsvarende prosjekter, f.eks. der geosynkroniseringsmekanismer benyttes til oppdatering av sentrale forvaltningsbaser.
- Hindre byråkrati som kan skape problemer for prosjektet
- Sørge for god evaluering av den kortsiktige løsningen ved overgang til langsiktig løsning, samt løpende innspill til utredning av langsiktig løsning.

Rapportering:

- Prosjektleder for hovedprosjekt og delprosjekter rapporterer til styringsgruppa.
- Styringsgruppa gir skriftlig respons på beslutningsgrunnlag til prosjekteier og prosjektleder.

Geovekst-forum

Geovekst-samarbeidet setter rammene for økonomien og organiseringen i det felles vedlikeholdet som det nye forvaltningssystemet skal benyttes innenfor.

Geovekst-forum fungerer som en referansegruppe for prosjektet. Geovekst-forum vil da være et diskusjonsforum hvor faglige spørsmål tas opp og det gis råd til løsninger.

Mandat referansegruppe:

- Være et rådgivende organ knyttet til brukerkrav for innhold og funksjonalitet, både knyttet til kommunale brukerløsninger og den sentrale forvaltningsløsningen. Prioritere brukerkrav slik at de antatt viktigste brukerkravene prioriteres høyest.
- Evaluere utviklingsarbeidet basert på fremdriftsrapport og eventuell demo fra prosjektgruppen på møter i Geovekst-forum. Tilbakemeldinger på evalueringen må ivareta prioriterte brukerkrav.
- Ansvarlig for FDV-økonomi, tilpasning av Geovekst kostnadsdelingsnorm
- Møtene i Geovekst-forum vil bli benyttet som møter for saker som skal behandles av referansegruppa. Det kan bli behov for ytterligere møter utover de ordinære møtene i Geovekst-forum, også møter på kort varsel (gjerne via Lync) dersom framdriften i prosjektet krever det.

Rapportering:

- Geovekst-forum mottar de samme rapportene som styringsgruppa.

- Skriftlig rapport til prosjektleder etter møter i Geovekst-forum

Prosjektgrupper

For hver av underprosjektene etableres det en prosjektgruppe med representanter for Kartverket, Geovekst-partene og aktuelle systemleverandører. Prosjektgruppene ledes av prosjektleder for delprosjektet. Prosjektgruppene styrer den faglige og praktiske jobben i prosjektet.

Prosjektgruppe delprosjekt Kortsiktig løsning

For den kortsiktige løsningen foreslås det opprettet en prosjektgruppe bestående av Kartverket og systemleverandører som suppleres av representanter fra Geovekst-partene ved behov.


Prosjektgruppe

Navn	Stilling	Ansvar i prosjektet/ fagområde
Nils Ivar Nes	Kartverket	Prosjektleder
Andreas Røstad	Kartverket (Land)	Utvikling Fysak, QMS, Bruk av NGIS-API +++
Jostein Amlien	Kartverket (I1)	Testing og drift av QMS
Lars Eggan	NOIS	Tilpasning og oppsett av kommunale løsninger til sentral FKB-forvaltning. Bidra i test, pilotering og innføring.
Thomas Johnsen	Norkart	Tilpasning og oppsett av kommunale løsninger til sentral FKB-forvaltning. Bidra i test, pilotering og innføring.

Prosjektgruppa vil ha jevnlig møter og har ansvar for å organisere arbeidet i prosjektet. Prosjektgruppa rapporterer til styringsgruppa for hovedprosjektet. De overordnede teknologiske valgene for den kortsiktige løsningen er gjort med bruk av NGIS-API, QMS og Geosynkronisering. Videre utvikling av QMS finansieres og styres direkte av Kartverket (og dermed ikke av dette prosjektet).

Innenfor disse rammene skal prosjektgruppa drøfte og gjøre valg for oppsett av sentral forvaltningsløsning (se notatet «Prosjektbeskrivelse» for eksempel på problemstillinger). Prosjektgruppa følger prosjektet under utvikling, pilotering og innføring.

Prosjektet vil organiseres i oppgaver knyttet til utvikling, drift og pilotering/utrulling, se figur.

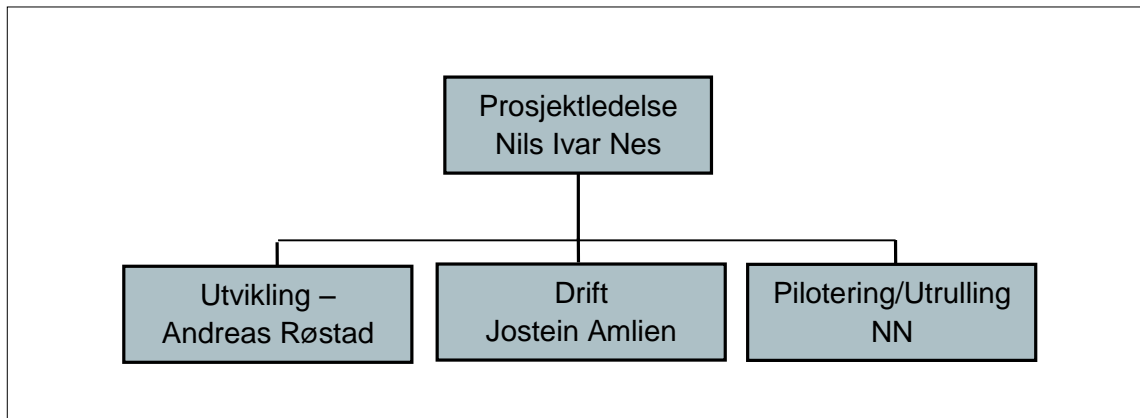

Prosjektdeltagere fra Geovekst-partene:

Navn	Stilling	Ansvar i prosjektet/ fagområde
Ingvild Nystuen Astrid Bjørnerød	NIBIO	Bidra faglig i oppsett av sentral forvaltningsløsning. Spesielt ivareta AR5.
Knut Jetlund Linda Støeng	Statens vegvesen	Bidra faglig i oppsett av sentral forvaltningsløsning. Spesielt ivareta Vegnett.
Geovekst-forum kan komme med forslag til representanter.	Kommune	Kommunenes behov vil i stor grad bli ivaretatt av systemleverandørene, men det kan vurderes 1-2 kommunerepresentanter. Ønskelig med kommune med spesielt engasjement for Bygg

Prosjektdeltagerne fra Geovekst-partene bør være «eksperter» på dataforvaltning spesielt innenfor sine temaer. Disse vil bli innkalt til prosjektgruppa ved behov og vil få en sentral rolle innenfor oppsett av forvaltningssystemet, spesielt innenfor sine temaområder. Prosjektdeltagerne fra Geovekst-partene vil ikke være like sentrale når prosjektet når innføringsfasen.

I tidligere utkast til prosjektet har det vært oppnevnt tematiske arbeidsgrupper for AR5, Veg og Byggtema. Det kan være aktuelt å vekke disse til live, men da som ressursgrupper til prosjektgruppa. Det vil da være naturlig at disse gruppene ledes av de respektive prosjektdeltakerne fra Geovekst-partene, og at ledelsen skjer i samspill med prosjektleder.

Ressursgruppene vil benyttes av prosjektet når det er behov for mer inngående diskusjoner av de fagspesifikke temaene med betydning for utvikling av brukerløsninger i kommunene, samt i utviklingen av grensesnittene i den sentrale forvaltningsløsningen. Møtene i gruppene vil satt opp etter behov i prosjektet, der korte Lync-møter kan være vel så aktuelt som dagsmøter, avhengig av temaets omfang.
